

PROGRAMA :

URB.

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

SUBPROGRAMA :

PAVIMENTACIÓN

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

Acta de entrega – Recepción de la obra

“REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS”

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024

Hora: 13:00 HORAS

Nombre del
proyecto:

“REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS”

Población: VICENTE GUERRERO ITURBIDE

Estado: CAMPECHE

000001

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MECANIZACION

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 15-MARZO-24, **Fecha de Término:** 13-ABRIL-24

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:		----- -----	----- -----		----- -----
ETAPA UNO	\$ 2,115,922.96			\$ 2,115,922.96	
ETAPA DOS	\$ 989,077.04			\$ 989,077.04	
EJERCIDA:		----- -----	----- -----		----- -----
ETAPA UNO	\$ 2,115,118.87			\$ 2,115,118.87	
ETAPA DOS	\$ 988,056.73			\$ 988,056.73	

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000002

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

LA PRESENTE OBRA DE REABILITACION DE CALLE CON DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, COLOCACION DEL LETRERO DE OBRA, SE REALIZARA EL ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, LA RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, COMPACTACION, PARA RECIBIR LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRA DE POLIPROPILENO, SE REALIZARAN LAS JUNTAS DE CONTROL NECESARIAS.

Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 29 DE FEBRERO DE 2024

Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-09/2024

COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-11/2024

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como
participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

- 11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)*

NINGUNA

- 12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

SERVICIOS PUBLICOS

Federal ()

Municipal (X)

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
R.M. 033-PAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

- 13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*
- 14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*

ENTREGA DE LA OBRA

000003

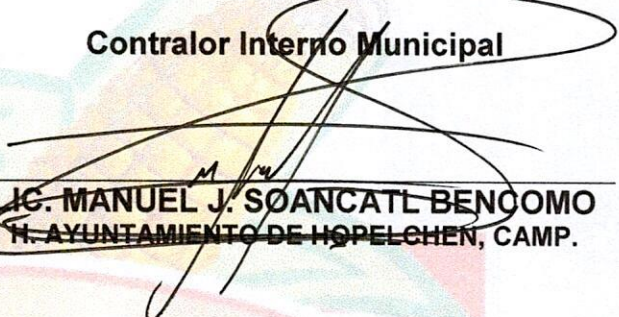


POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal


ING. EFRAIN TUN MONTOY
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**


C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

000004

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

Horrible.



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CARGO:

ING. IRVIN LOBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

Nombre y firma

000005

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

LuA
c. *Cluber Catzintan*

Rosalia
c. *Maria Rosalia Pen*

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
Secretaría
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

CON EL PATROCINIO DEL
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

c. *Eduan Briceño Pech*

c. *Daniel Tecmatos*

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

000006

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

C. Bertolino POC

C. Jose Luis OS

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
Secretaría
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: HI-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. Nereida del Rosario Lara Pool

C. Victor OS Canuich



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

000007

EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024, ESTANDO PRESENTE EL ING. EFRAIN TUN MONTOY EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CESAR ANTONIO CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTADO POR C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS BERZUNZA QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS ” ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-09/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-011/2024 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2024, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN-09/2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 15 DE MARZO DE 2024 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 13 DE ABRIL DE 2024, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$3,103,175.61 SON: (TRES MIL TRESCIENTOS TRESCIENTOS Y CINCO PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 24A24883 DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  ING. EFRAIN TUN MONTOY PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTANTE LEGAL
---	--

TESTIGOS

 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK SUPERVISOR DE OBRA
--	---

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

000008

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2024, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING. IRVIN OBED COLLI CHI Y EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK Y POR PARTE EL CONTRATISTA C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTADA POR LA. C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-09/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-011/2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-09/2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024.

I.-Datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-09/2024
FECHA DE FORMALIZACION:	14 DE MARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS
LOCALIDAD:	VICENTE GUERRERO ITURBIDE

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
R.D.O.: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTADO DE GUATEMALA
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
UNO.- EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$3,103,495.56
------------------------------	----------------

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	13 DE ABRIL DE 2024

II.-MODIFICACIONES

000009

FECHA DE INICIO REAL:	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	13 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	N/A
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	N/A
PORCENTAJE DE MODIFICACION:	N/A

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (UNO)	29-MARZO-2024	15-MARZO-2024 29-MARZO-2024	\$ 2,513,343.00	\$ 2,513,343.00
2 (FINIQUITO)	13-ABRIL-2024	30-MARZO-2024 13-ABRIL-2024	\$ 589,832.61	\$ 3,103,175.61

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **13 DE ABRIL DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

000010

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO GAUICH KUK

SUPERVISOR DE OBRAS

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS BERZUNZA

CONTRATISTA

CONSTITUYENTES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:


000011

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. EDGAR ANTONIO CAUCH KUK** Y POR PARTE EL CONTRATISTA **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR LA. **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-09/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-011/2024** DE FECHA **29 DE FEBRERO DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-09/2024** DE FECHA **14 DE MARZO DEL 2024**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **15 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024**, ES DECIR, UN PLAZO DE **30 DÍAS NATURALES**, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **15 DE MARZO DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **13 DE ABRIL DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 3,103,175.61 SON: (TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

**DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

TERRACERIAS

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS

EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACIÓN:

CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KM EN CAMINO EN DE TERRACERIA.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %

MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO.

PAVIMENTOS

LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR

OBRA COMPLEMENTARIA

TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS
LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (UNO)	29-MARZO-2024	15-MARZO-2024 29-MARZO-2024	\$ 2,513,343.00	\$ 2,513,343.00
2 (FINIQUITO)	13-ABRIL-2024	30-MARZO-2024 13-ABRIL-2024	\$ 589,832.61	\$ 3,103,175.61

"los importes ya incluyen IV.A


En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

000013

AL PRESENTE ACTA SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Fianza de vicios ocultos.
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: NP2024



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

RESIDENTE DE OBRA

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CONSTRATISTA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
