

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Hopelchén, Campeche, a 08 de mayo del 2024.

OFICIO: HAH/DOP/297/2024

ASUNTO: Trámite de Pago

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigirme a usted para solicitarle el pago de la Estimación no. 1 (FINIQUITO) de la Obra: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de HOPELCHEN Municipio de Hopelchen, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-15/2024 a favor de la **PERSONA FISICA: OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** se solicita el pago **\$1,688,631.19 SON: (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.) DE FAISMUN 2024** Se anexa la siguiente documentación:

- Factura no. 321
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Memoria fotográfica.
- Croquis
- Catalogo definitivo.
- Oficio de termino de obra.
- Acta entrega recepción contratista.
- Acta entrega de comité de obra.
- Acta entrega física de la obra.
- Acta finiquito de obra.
- Fianza de vicios ocultos.
- Bitácora de obra.

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 08 MAY 2024 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO



Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo ~~agradeciendo~~ la atención al presente.

ATENTAMENTE
DIRECCION DE PLANEACIÓN
ING. IRVINO BED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C.c.p Archivo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.
CARÁCTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000032



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EH0

CONTRATISTA:	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA				
DOMICILIO:	CALLE 15 NO. 113 ENTRE 20 Y 22 COL CENTRO CALKINI CAMPECHE				
RFC:	CABO900616	ESTADO:	CAMPECHE	FECHA:	25-abr-24

OBRA:	LOCALIDAD:	ESTIMACION No.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	HOPELCHEN	UNICA (FINIQUITO)
	MUNICIPIO	
	HOPELCHEN	

CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO:		ANTICIPO	DURACION DE LA OBRA.	
HAH-DOP-FAISMUN-15/2024	IMPORTE S/IVA	\$ 2,079,595.06	\$ 623,878.52	PERIODO:	20
	IVA:	\$ 332,735.21	\$ 99,820.56	INICIO:	06-abr-24
	TOTAL C/IVA	\$ 2,412,330.27	\$ 723,699.08	TERMINO:	25-abr-24
No. FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	24A18519	DORAMA		PERIODO DE ESTIMACION	
No. FIANZA DE ANTICIPO:	24A18517	DORAMA		DEL:	06-abr-24
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	24A24823	DORAMA		AL:	25-abr-24

Recibí del Municipio de Hopelchen, Campeche, la cantidad de :		\$1,688,631.19	AVANCE DE OBRA:	
(UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)			Financiero:	100.00%
Por concepto de pago de la estimacion No:		UNICA (FINIQUITO)	Fisico:	100.00%

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
0.5 % INSP. DE OBRAS.	\$0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$2,079,595.06
		AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO	\$623,878.52
		SUBTOTAL	\$1,455,716.54
1.0 % OBRAS DE BENEF. SOCIAL	\$0.00	16.00% IVA	\$232,914.65
		SUBTOTAL	\$1,688,631.19
		MENOS DEDUCCIONES	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES	\$0.00	NETO A PAGAR	\$1,688,631.19

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO ANT.	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	SALDOS
CONTRATO C/IVA INCLUIDO:	\$ 2,412,330.27		\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$ 0.00
ANTICIPO S/IVA INCLUIDO:	\$ 623,878.52		\$623,878.52	\$623,878.52	\$ 0.00

RECIBI.

REVISO.

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
Contratista

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
Supervisor H. Ayuntamiento

Vo.B.
DIRECCION DE PLANEACION
ING. IRVIN JED COLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000040



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

ESTADO FINANCIERO						ESTIMACION No.		UNICA (FINIQUITO)	
OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN						Contrato:		HAH-DOP-FAISMUN-15/2024	
LOCALIDAD: HOPELCHEN						Fecha:		25-abr-24	
IMPORTE DEL CONTRATO SIN/ IVA		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL CONVENIO S/IVA		IMPORTE ANTICIPO			LIQUIDO A PAGAR
						S/IVA	IVA	TOTAL	
\$ 2,079,595.06		06-abr-24	25-abr-24	\$ -		\$ 623,878.52	\$ 99,820.56	\$ 723,699.08	
No. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUBTOTAL	I.V.A	-1% OBRAS DE BENEF. SOCIAL	-0.5% INSP. OBRAS		
1	DEL: 06-04-24 AL: 25-04-24	\$ 2,079,595.06	\$ 623,878.52	\$ 1,455,716.54	\$ 232,914.65	\$ -	\$ -		\$ 1,688,631.19
TOTAL		\$ 2,079,595.06	\$ 623,878.52	\$ 1,455,716.54	\$ 232,914.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,688,631.19
SALDO DEL CONTRATO (S/IVA):		\$ 0.00		SALDO AMORTIZACION DE ANTICIPO S/IVA:		\$ 0.00			
SALDO DEL CONTRATO (C/IVA):		\$ 0.00		SALDO AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA:		\$ 0.00			
TOTAL EJERCIDO S/IVA		\$ 2,079,595.06		IVA	\$ 332,735.21	TOTAL EJERCIDO C/IVA:		\$ 2,412,330.27	

RECIBI.

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
Contratista

Vo.Bo.

DIRECTOR DE OBRAS PUEBlicas DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

REVISO.

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
Supervisor H. Ayuntamiento

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000011



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-15/2024

OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD:

HOPELCHEN

CUERPO DE ESTIMACION

CANTIDADES DE OBRA									
CLAV	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	POR EJERCER	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1			\$ 4,783.49	\$	4,783.49
	DESMANTELAMIENTOS DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	58	58			\$ 396.56	\$	23,000.48 ✓
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	58	58			\$ 8,194.43	\$	475,276.94 ✓
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	58	58			\$ 2,703.55	\$	156,805.90 ✓
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	58	58			\$ 643.29	\$	37,310.82 ✓

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

000042



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-15/2024

OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD:

HOPELCHEN

CUERPO DE ESTIMACION

CANTIDADES DE OBRA								
CLAV	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	POR EJERCER	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.							\$
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1			\$ 4,783.49	\$ 4,783.49
	DESMANTELAMIENTOS DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	54	54			\$ 396.56	\$ 21,456.24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	54	54			\$ 8,194.43	\$ 442,499.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	54	54			\$ 2,703.55	\$ 145,991.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	54	54			\$ 643.29	\$ 34,737.66

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PRECATORIO DE CARACTER PUBLICO ALEJO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

000043



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO: **HAH-DOP-FAISMUN-15/2024**

OBRA: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

LOCALIDAD:

HOPELCHEN

CUERPO DE ESTIMACION

C A N T I D A D E S D E O B R A									
CLAV	C O N C E P T O	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	POR EJERCER	PRECIO UNITARIO	I M P O R T E	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1			4,783.49	\$	4,783.49
	DESMANTELAMIENTOS DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	61	61			396.56	\$	24,190.16
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	61	61			8,194.43	\$	499,860.23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	61	61			2,703.55	\$	164,916.55
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	61	61			643.29	\$	39,240.69

SUBTOTAL \$ 2,079,595.06
IVA (16%) \$ 332,735.21
TOTAL \$ 2,412,330.27

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

**DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: II/2024**

**ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO. NIENOA
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA**



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EHO

NO. CONTRATO

HAH-DOP-MUN-15/2024

INICIO 06-abr-24

OBRA:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	UNID	LARGO				ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION	
				EJE	A	EJE						PARCIAL	TOTAL

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.

DESMANTELAMIENTOS DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 K CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACION

NO.	Latitude	Longitude	
62	19.74113832	-89.843814	1.00
63	19.74092531	-89.843408	1.00
64	19.74072177	-89.84296	1.00
65	19.74193924	-89.845374	1.00
66	19.74205285	-89.845983	1.00
67	19.74214247	-89.846459	1.00
68	19.74309864	-89.843286	1.00

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO ADECUA CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ING. EDGAR ANTONIO CAMICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA.

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

000045



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO

HAH-DOP-15/2024

INICIO 06-abr-24

OBRA:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION	
		UNID	EJE	A EJE						PARCIAL	TOTAL
					69	19.74284145	-89.843019				1.00
					70	19.74261835	-89.842765				1.00
					71	19.74225891	-89.842511				1.00
					72	19.74181207	-89.842258				1.00
					73	19.74088618	-89.840492				1.00
					74	19.74103671	-89.840235				1.00
					75	19.74125887	-89.840131				1.00
					76	19.74153531	-89.839792				1.00
					77	19.7419162	-89.839448				1.00
					78	19.74212416	-89.839273				1.00
					79	19.74245141	-89.839159				1.00
					80	19.74257511	-89.839066				1.00
					81	19.74304342	-89.838987				1.00
					82	19.7434972	-89.838863				1.00
					83	19.74391974	-89.838792				1.00
					84	19.74370674	-89.837528				1.00
					85	19.74380993	-89.838147				1.00
					86	19.74389292	-89.838484				1.00
					87	19.74445147	-89.841513				1.00
					88	19.74427507	-89.840818				1.00
					89	19.74422048	-89.840542				1.00
					90	19.74410183	-89.839996				1.00
					91	19.74402009	-89.8394				1.00
					92	19.74365498	-89.839505				1.00
					93	19.74328009	-89.839562				1.00
					94	19.74291025	-89.839719				1.00
					95	19.74256154	-89.83974				1.00
					96	19.74222578	-89.83984				1.00
					97	19.74219264	-89.840221				1.00
					98	19.74235074	-89.84068				1.00
					99	19.74258647	-89.840941				1.00
					100	19.74277802	-89.841204				1.00

**DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARACTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAJICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

000046



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EHO

NO. CONTRATO
OBRA:

HAH-DOP-15/MUN-15/2024

INICIO 06-abr-24

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN;
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN;
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO		LOCALIZACION										LOCALIZACION	
CLAVE		UNID	EJE	A	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	PARCIAL	TOTAL	
						101	19.74306361	-89.841653				1.00	
						102	19.74109698	-89.839151				1.00	
						103	19.74132167	-89.83947				1.00	
						104	19.74161136	-89.838578				1.00	
						105	19.74175684	-89.839024				1.00	
						106	19.74209292	-89.839843				1.00	
						107	19.74443853	-89.839375				1.00	
						108	19.74479986	-89.839302				1.00	
						109	19.74522839	-89.839207				1.00	
						110	19.74573834	-89.839095				1.00	
						111	19.74616498	-89.838997				1.00	
						112	19.74672321	-89.839935				1.00	
						113	19.74626501	-89.840148				1.00	
						114	19.74582165	-89.840378				1.00	
						115	19.7459261	-89.840709				1.00	
						116	19.74289668	-89.842038				1.00	
						117	19.74260004	-89.842233				1.00	
						118	19.74222168	-89.842212				1.00	
						119	19.74192504	-89.841797				1.00	
											TOTAL	58.00	


DIRECCION DE
OPERACION
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL 58.00

TOTAL 58.00

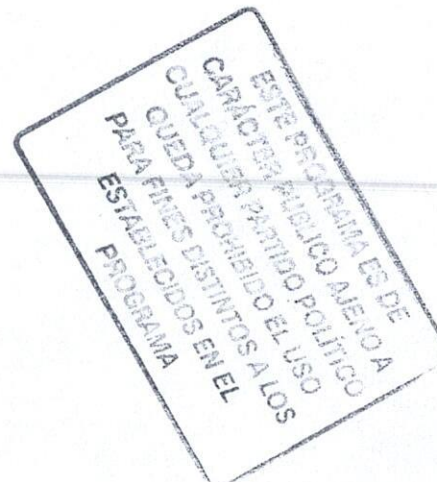

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAJICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA.

000047

0007



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EHO

NO. CONTRATO
OBRA:

HAH-DOP-FAISMUN-15/2024

INICIO 06-abr-24

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN;
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO		LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION	
			UNID	EJE A EJE						PARCIAL	TOTAL
					131	19.75307689	-89.838605				1.00
					132	19.75273326	-89.837603				1.00
					133	19.75259662	-89.837318				1.00
					134	19.75224826	-89.836373				1.00
					135	19.7515288	-89.83835				1.00
					136	19.75103213	-89.837308				1.00
					137	19.75085447	-89.83695				1.00
					138	19.75046886	-89.83611				1.00
					139	19.75028837	-89.835685				1.00
					140	19.75245273	-89.83567				1.00
					141	19.75163735	-89.836095				1.00
					142	19.75069922	-89.836563				1.00
					143	19.75027227	-89.836762				1.00
					144	19.74988698	-89.836955				1.00
					145	19.74946477	-89.837263				1.00
					146	19.74909526	-89.837503				1.00
					147	19.74872101	-89.837806				1.00
					148	19.74827355	-89.838111				1.00
					149	19.74776329	-89.83815				1.00
					150	19.74727985	-89.838632				1.00
					151	19.74733382	-89.839102				1.00
					152	19.74741996	-89.83951				1.00
					153	19.74743227	-89.839514				1.00
					154	19.74709115	-89.839736				1.00
					155	19.7491388	-89.840674				1.00
					156	19.74920823	-89.841087				1.00
					157	19.74933508	-89.841502				1.00
					158	19.74942785	-89.841775				1.00
					159	19.74946635	-89.842013				1.00
					160	19.74943827	-89.842543				1.00
					161	19.74939251	-89.84286				1.00
					162	19.75010408	-89.838405				1.00
					163	19.75007758	-89.837921				1.00
					164	19.74995672	-89.837372				1.00
					165	19.74857932	-89.837795				1.00

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CALICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA.



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO

OBRA:

HAH-DOF-MUN-15/2024

INICIO 06-abr-24

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO		LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION	
			UNID	EJE A EJE						PARCIAL	TOTAL
					166	19.74818992	-89.837318				1.00
					167	19.74787184	-89.836843				1.00
					168	19.74761498	-89.83642				1.00
					169	19.74760362	-89.835736				1.00
					170	19.74781662	-89.835547				1.00
					171	19.74781315	-89.835543				1.00
					172	19.74826534	-89.835255				1.00
					173	19.74711324	-89.83553				1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL 54.00

TOTAL 54.00

TOTAL 54.00

TOTAL 1.00
TOTAL 1.00

TOTAL 54.00
TOTAL 54.00

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CALICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA.

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO AGENA CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

000050

☐ ☐ ☐ ☐ ☐



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EHO

NO. CONTRATO

OBRA:

HAH-DOP-FAISMUN-15/2024

INICIO

06-abr-24

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO			LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION	
				UNID	EJE A EJE						PARCIAL	TOTAL
						19	19.73854494	-89.846533				1.00
						20	19.73830005	-89.846677				1.00
						21	19.73885136	-89.846993				1.00
						22	19.73927171	-89.846713				1.00
						23	19.73960685	-89.84665				1.00
						24	19.73981544	-89.846596				1.00
						25	19.74003855	-89.846499				1.00
						26	19.74054883	-89.846306				1.00
						27	19.74089502	-89.846071				1.00
						28	19.74136175	-89.845822				1.00
						29	19.74175684	-89.84564				1.00
						30	19.74208693	-89.845588				1.00
						31	19.74245488	-89.84555				1.00
						32	19.74293076	-89.845468				1.00
						33	19.74307339	-89.845402				1.00
						34	19.74350825	-89.845243				1.00
						35	19.7437405	-89.845212				1.00
						36	19.74387336	-89.845225				1.00
						37	19.7439999	-89.851293				1.00
						38	19.74373041	-89.85143				1.00
						39	19.74344513	-89.851562				1.00
						40	19.74307339	-89.851742				1.00
						41	19.74274236	-89.851945				1.00
						42	19.74241007	-89.852055				1.00
						43	19.74210397	-89.8516				1.00
						44	19.74168805	-89.851021				1.00
						45	19.74153784	-89.850866				1.00
						46	19.74129011	-89.850382				1.00

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAIMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARACTER PUBLICO POLITICO
CUALQUIER PROHIBIDO EL USO
QUEDA A PROHIBIDOS A LOS
PARA FINES DISTINTOS EN EL
PROGRAMA
ESTABLECIDOS EN EL

000002

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO
OBRA:

HAH-DOP MUN-15/2024

INICIO 06-abr-24

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN;
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

TERMINO 25-abr-24

LOCALIDAD

HOPELCHEN

EST. NO

UNICA (FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION					LOCALIZACION					
		UNID	EJE	A	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	PARCIAL	TOTAL
						47	19.74096507	-89.849885				1.00
						48	19.74079656	-89.849512				1.00
						49	19.74039831	-89.849085				1.00
						50	19.74033298	-89.8459				1.00
						51	19.74340979	-89.84354				1.00
						52	19.74202224	-89.843321				1.00
						53	19.74177798	-89.84279				1.00
						54	19.74156718	-89.842286				1.00
						55	19.74017677	-89.84098				1.00
						56	19.73976495	-89.840782				1.00
						57	19.73944717	-89.840593				1.00
						58	19.73991832	-89.843523				1.00
						59	19.74002214	-89.843702				1.00
						60	19.74030868	-89.843631				1.00
						61	19.740226	-89.844012				1.00
											TOTAL	61.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										TOTAL	61.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										TOTAL	61.00
											TOTAL	61.00

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CUAICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA.

000053



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO: **HAH-DOP-FAISMUN-15/2024**

OBRA:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD:

HOPELCHEN

CATALOGO DEFINITIVO

CANTIDADES DE OBRA						
CLAV	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.					\$
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1	\$ 4,783.49	\$
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	54	54	\$ 396.56	\$
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO	pza	54	54	\$ 8,194.43	\$ 442,499.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	54	54	\$ 2,703.55	\$ 145,991.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	54	54	\$ 643.29	\$

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

000065



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EHO

NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-15/2024


OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CATALOGO DEFINITIVO

CANTIDADES DE OBRA						
CLAV	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1	\$ 4,783.49	\$ 4,783.49
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	58	58	\$ 396.56	\$ 23,000.48
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	58	58	\$ 8,194.43	\$ 475,276.94
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	58	58	\$ 2,703.55	\$ 156,805.90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	58	58	\$ 643.29	\$ 37,310.82

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

000066



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-15/2024

OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CATALOGO DEFINITIVO

CANTIDADES DE OBRA						
CLAV	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD EN CONTRATO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1	4,783.49	\$ 4,783.49
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	61	61	396.56	\$ 24,190.16
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON CUERPO DE ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS PARA MONTAJE EN POSTES CON UN INDICE DE PROTECCION DE IP 67, CON UNA TECNOLOGIA LED CREE DE 2 A 4 MODULOS Y UNA OPTICA DE T2M CON POTENCIA DE 72-73 WATTS Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000°K, 4000 k CUENTA CON UN DRIVER PHILIPS DE 120-277V, UNA VIDA UTIL DE 100,000 HRS, MODELO LUMA 2 SIMILAR O IGUAL CALIDAD INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	61	61	8,194.43	\$ 500,060.23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR ROJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	61	61	2,703.55	\$ 164,916.55
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW VDE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	lt	61	61	643.29	\$ 39,240.69

\$ 2,079,595.06
\$ 332,735.21
\$ 2,412,330.27

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: 11-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARACTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTAS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
